

## Månadsrapport Larslunda simhall, t.om. 2024-01-17

Undertecknad, såsom projektchef, rapporterar utvecklingen för Larslunda simhalls framdrift av byggprojektet. Denna gång för nästan två månader.

### Tider

Vinter pågår, vilket gör att samordningen av de olika entreprenaderna är riktigt tufft. Detta samtidigt som vi upplevt mycket helger, där olika entreprenörer arbetat utan allas närvaro.

Byggnationen har framskridit så att vi inte har en enkel access till bottenvåningen på ett enkelt vis, vilket ger en viss utmaning för arbetsmiljön. Fördelen är att det inte pågår några fysiska aktiviteter på detta plan, för närvarande. Framgent måste utrymningsvägar arrangeras.

Vinter är vinter, men denna säsongen har det varit mycket kyla och snö, men vi får assistans av kommunen för att hålla arbetsplatsen öppen.

### Aktiviteter

Gjutning platta på mark, bassängbottnar bassängväggar och mellanbjälklag pågår..

Mediaförsörjning pågår inom arbetsområdet, där vi i närtid kommer att kunna nyttja fjärrvärme genom den framtida anslutningen.

### Entreprenader

Följande är avtalade under perioden:

- Ställningar.
- Rörliga mellanbottnar.

### Etablering

#### *Byggström*

Inga förändringar är planerade.

#### *Internet*

Inga förändringar är planerade.

#### *VA*

Inga förändringar är planerade.

#### *Skalskydd & Skyltning*

Förändrad kameraövervakning pågår.

ID06

Inga förändringar är planerade.

Arbetsmiljö

Under kontroll.

**Påverkan**

Kylan påverkar gjutningar, då det krävs värme för att inte skada betongen.

**Awikelser**

Smärre påpekanden, som hanteras direkt av respektive entreprenör.

**Framdrift**

Ingen återhämtning har skett av de eftersläpande veckorna.


**Upphandlingar**

Upphandling pågår enligt följande:

- Ytskikt

**Ekonomi**

Övergripande bild över ekonomin (2024-01-08):

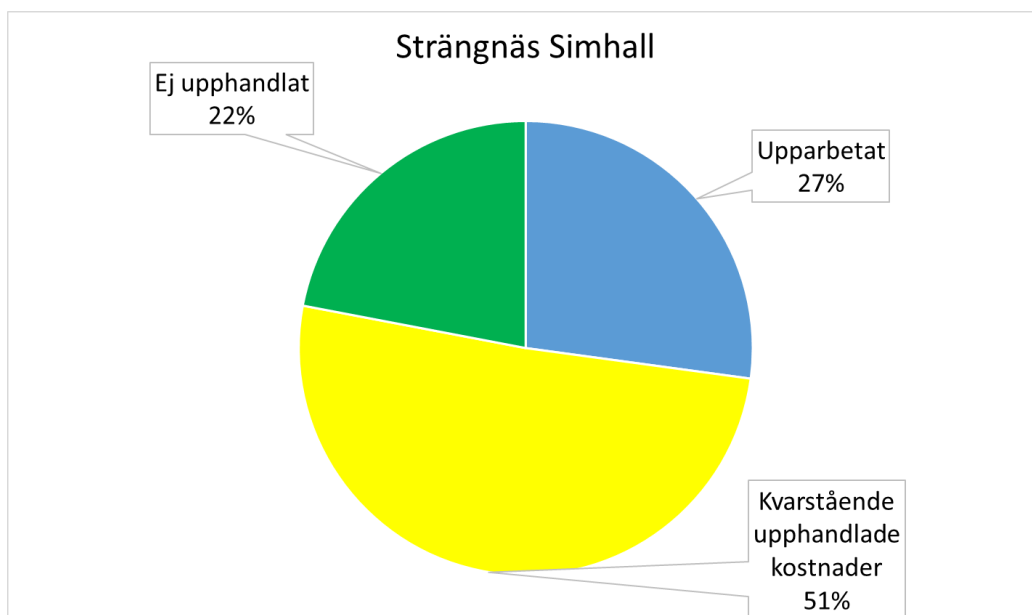

## Summering

Samverkan fungerar, där alla engagerar sig i att det skall bli ett kvalitativt hus och hela tiden vara en säker arbetsplats. För att inte hamna i ett sent skede pågår kontinuerligt tekniska, samordning och ekonomiska avstämningar med respektive entreprenör.

Göteborg 2024-01-17

Vid tangentbordet; Mille Örnmark, med assistans av övriga i projektledningen.
